

vpsAdmin WebUI Next

Dva týdny na sjednocení releasu, uzavření klíčových workflow a zrychlení UI.

VÝCHOZÍ SITUACE

Od čeho se odrazit

Největší riziko teď není nedostatek nápadů, ale rozštěpený zdroj pravdy. Nasazené seskupení lokalit a tři zelené změnové větve ještě netvoří jeden společný release. Tento plán proto nejdřív stabilizuje vydávání a až potom uzavírá CVE, subdatasety, incidenty, DNS a výkon stránky Sít'.

8

pracovních dnů
3 dny tento týden + 5 dní příští týden

4

změnové linie mimo main
release, subdatasety, CVE a pražské IP

2

cílové weby
clankerdev.vpsfree.cz a dev.crucio.cz

1

kanonický release
stejný Git SHA a build checksum všude

ŠEST MĚŘITELNÝCH VÝSTUPŮ

Výsledek po dvou týdnech

01 Release Jeden commit a manifest pro oba weby.	02 CVE Admin správa včetně publish/retract a vazeb.	03 User flow Subdatasety a incidenty bez obcházení práv.
04 DNS Primární a sekundární zóny mají správné workflow.	05 Sít' Méně requestů a obsah bez dlouhého čekání.	06 Důkazy Permission matrix, CI, Playwright a SHA parity.

První rozhodnutí

Ve středu nevytvářet další feature. Nejdřív dát do pořádku release baseline, aby se žádná hotová oprava při dalším nasazení neztratila.

POŘADÍ PRÁCE A KAPACITA

Mapa dvou týdnů

Barevný pruh znamená aktivní práci; tečka znamená ověřovací nebo release gate.

Pracovní proud	St 29/7	Čt 30/7	Pá 31/7	Po 3/8	Út 4/8	St 5/8	Čt 6/8	Pá 7/8
Release baseline	•	•	•					•
Cluster / IP / subdatasetsy	•	•		•				
Security advisories		•	•					
User incident workflow				•				
DNS					•	•		
Síť - výkon a UX							•	
Permissions / CI / release			•					•

BEZ PŘETÍŽENÍ PARALELNÍMI TÉMATY

Rozdělení kapacity



1

Sjednotit release

Bez toho se může hotová oprava ztratit.

2

Integrovat hotové proudy

Nevyrábět stejnou funkci podruhé.

3

Teprve potom nové workflow

DNS a Síť řešit nad stabilní verzí.

STŘEDA 29. 7. - PÁTEK 31. 7.

Tento týden: dát dohromady jeden release

Týdenní cíl

Do pátku mít jednu integrační linii, všechny menší hotové změny uvnitř, správu CVE ověřenou a důkaz, že oba weby lze vydat ze stejného commitu.

Den	Fokus	Co konkrétně udělat	Důkaz hotovo
St 29. 7.	Release baseline	Inventura main, nasazeného commitu a tří zelených větví. Integrační větev, release manifest, build SHA a kontrola checksumu obou webrootů.	Jeden seznam commitů a reprodukovatelný build. Je zřejmé, co běží na clankerdev a co na dev.
Čt 30. 7.	Menší hotové proudy	Začlenit cluster groups, pražské IP a subdatasetové testy. Ověřit create/cancel/delete/error/retry/busy/ownership a přesný payload. Pokročilé ZFS ponechat skryté.	Typecheck, unit testy, build a cílený Playwright desktop/mobile jsou zelené. Pražské produkční IP jsou ve vzorku první.
Pá 31. 7.	Security advisories / CVE	Integrovat existující velkou větev po blocích. Capability gate, create/update/publish/retract, CVE, nody, odstávky, public privacy, chyby a double submit. Aktualizovat dokumentaci.	Targeted E2E a mutation audit prošly; draft ani interní data nejsou veřejná; dokumentace odpovídá vydané funkci.

Praktická pravidla

- Žádný slepý merge velké CVE větve.
- Každý blok musí mít vlastní test a viditelný dopad.
- Necommitovat build artefakty ani lokální auth data.
- Při API mezeře ji popsat, ne maskovat frontendem.

Páteční release gate

- GitHub CI je zelené.
- Broad Playwright prošel proti dev.crucio.cz.
- Oba weby ukazují stejný Git SHA.
- Statický obsah má stejný checksum.
- Krátký release report uvádí rizika a rollback bod.

Konec týdne

Nové funkce lze bezpečně plánovat až ve chvíli, kdy je jasné, že další deploy nepřepíše už hotové změny starším buildem.

PONDĚLÍ 3. 8. - PÁTEK 7. 8.

Příští týden: uzavřít workflow a zrychlit UI

Den	Fokus	Co konkrétně udělat	Důkaz hotovo
Po 3. 8.	User workflow	Live smoke subdatasetů. Incident ze seznamu i z detailu VPS. Pouze vlastní VPS, cizí ID blokové. Validate, error/retry a double-submit ochrana.	Přesný payload a scope jsou v E2E. Testovací data se po scénáři uklídí.
Út 4. 8.	DNS - model	První krok Primární / Sekundární. Zobrazit a poslat jen relevantní pole. U secondary neposílat nevhodné internal_source. Capability-based UI.	Oba create scénáře mají kontraktový test a živý smoke; interní hodnoty API se nezobrazují.
St 5. 8.	DNS - provoz	Skutečný transfer log sekundární zóny. User-scoped TSIG a servery zóny. Ověřit secret handling, user/admin práva a sekundární informační architekturu.	Transfer výsledek, chyba i zpráva serveru jsou vidět; secret se nevrací do UI ani logů.
Čt 6. 8.	Sít' - výkon	Změřit počet requestů a čas do obsahu. Odstranit per-VPS N+1. Záložky Adresy/Provoz/Živé načítat lazy; polling pouze na aktivní živé záložce.	Tabulka před/po dokládá méně requestů a rychlejší první obsah. Mobile smoke je zelený.
Pá 7. 8.	Hardening a release	Permission matrix user/admin, mutation surface audit, full live Playwright, GitHub CI, build SHA a checksum parity. Aktualizovat audit a backlog.	Všechny gate prošly a oba weby běží ze stejného commitu. Existuje krátký release report.

Měřitelný výkon stránky Sít'

Metrika	Před	Cíl po úpravě	Jak ověřit
Počet requestů při otevření Sít'	N podle počtu VPS + traffic dotazy	Konstantní počet pro první obsah	Playwright network trace
Traffic při otevření Adresy	Načítá se předem	0 traffic requestů do otevření záložky	Request assertion
Live polling po opuštění	Riziko pokračujícího pollingu	0 nových requestů po unmountu	Časované E2E

Páteční rozhodnutí


Pokud API některou DNS nebo síťovou operaci neumí, zapsat konkrétní API gap. Nevyrábět falešný ovládací prvek, který jen vypadá hotově.

PRIORITY, DEFINITION OF DONE A VĚDOMÉ HRANICE

Co hlídat, aby se plán nerozpadl

Dopad vs. náročnost

Výše = větší dopad, vpravo = vyšší náročnost.

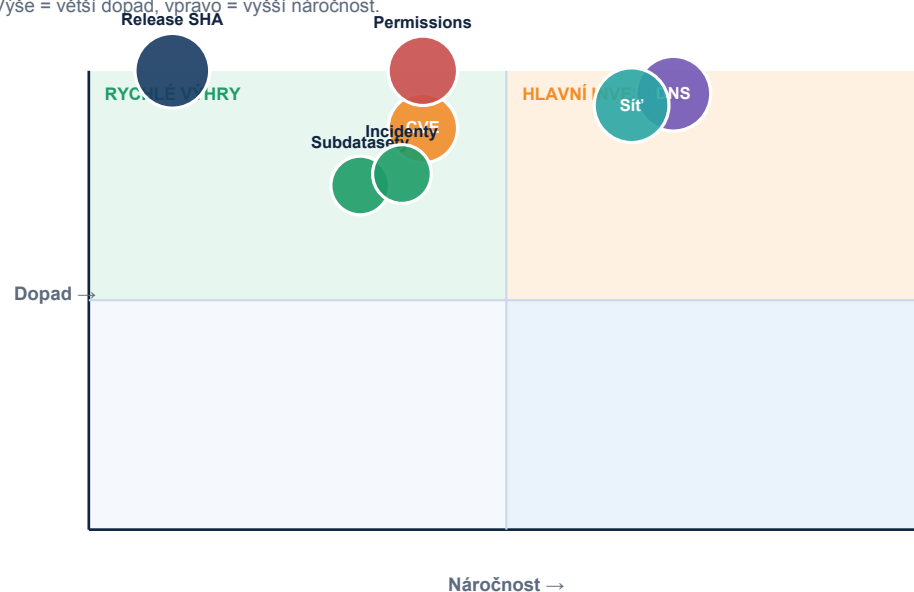

Definition of Done

- Oprávnění vychází z capability API a vlastnictví.
- UI nezobrazuje interní hodnoty místo popisků.
- Mutace má přesný payload a zámek proti dvojklíku.
- Chyba je srozumitelná a retry neztrácí data.
- Existuje unit nebo cílený Playwright test.
- Typecheck, testy a build prošly.
- Kritický tok je ověřen živě na dev.crucio.cz.
- GitHub CI je zelené.
- Oba weby dokazují stejný Git SHA.

Vědomě mimo tento dvoutýdenní blok

- další redesign dashboardu a veřejného statusu
- obecný redesign navigace
- nové informační karty bez vazby na workflow
- registrace a schvalování, dokud nejsou znovu v rozsahu
- globální platby a node create/edit, pokud nic neblokuje

Další odrazový bod po 7. 8.

1. Pokud je DNS kontrakt kompletní, pokračovat globálními platbami a node storage/maintenance paritou.
2. Pokud přetrvávají API mezery, sepsat backend backlog podle konkrétních endpointů.
3. Pokud se rozcházejí verze webů, zastavit features a dokončit automatický release gate.

Znamé riziko mimo plán

Statický audit našel, že schválení/ignorování registrace může odeslat mutaci už při prvním kliknutí. Protože registrace jsou nyní explicitně mimo rozsah, tuto akci do zařazení bezpečnostní opravy nepoužívat.
