

AUDITOVANÁ VERZE 3

vpsAdmin WebUI Next

Dva týdny skutečného posunu

30. 7. - 12. 8. 2026 · 10 pracovních dnů · přibližně 75 hodin
Hotové věci se neopakují. U každého dne je jasně „už funguje“ versus „dodělat“.

Hlavní změna: HEAD už řadí Praha Production nahoru a user už založí subdataset z NAS seznamu. Den 1 proto nic z toho nestaví znovu: dokončí celý životní cyklus subdatasetu ze tří vstupů a pouze zpevní IP výběr.

01 Samoobsluha

Subdatasety create/edit/delete ze tří vstupů

02 CVE

Admin workflow + veřejný detail + lifecycle

03 DNS a Síť

Secondary, transfer log, TSIG, výkon a live

04 Release

Permission, i18n, security, full E2E a důkazy

Co už je hotové a co je skutečná práce

Výsledek opakované kontroly HEAD, feature větví, capability matice a cílených testů.


HOTOVO V HEAD — NEOPAKOVAT	HOTOVO MIMO HEAD — PORTOVAT	SKUTEČNÉ MEZERY / BLOCKERY
• Stavý akcí mimo primární menu; deep-link detail zůstává • status lokace stejné app/public • user NAS create už funguje; advanced ZFS je skryté • VPS user/admin permission split • účet: profil, MFA, relace, SSH, metriky, mail, user-data • centrované modaly + číslované stránkování • DNS detail primary/secondary + blank TTL + bez preview • traffic: 6 měsíců, větší graf, Overview/Breakdown • Praha Production už je nahoře; user IP scope respektuje lokalitu	• e5abd0b: hardening existujícího Praha vzorku na přesných 3+3+3 • 743dc9a/fb211f9: rozšíření NAS create na detail/VPS + safe delete • deb8b7e: admin CVE CRUD/lifecycle/relations/public detail • subdataset snapshot: typecheck + 12/12 testů • CVE snapshot: typecheck + 43/43 testů • port po malých blocích přes novější security baseline • žádný slepý merge 7k řádkového CVE commitu	• IncidentReport::Create je admin_only • secondary DNS create chybí • skutečný transfer log chybí • TSIG user scope a secret lifecycle nejsou bezpečné • Síť má per-VPS N+1 + 6 eager traffic requestů • user Live chybí • admin filtry existují v helperu, ne v UI • Účet Prostředky nemá balíčky/prostředí • build-info/SHA provenance chybí

Ověření	Výsledek	Význam pro plán
Aktuální dotčený HEAD	31/31 cílených testů	baseline je stabilní
DNS/Síť audit	33/33 cílených unit testů	existující UX se pouze regresně hlídá
HEAD + archiv subdataset	NAS create v HEAD; archiv 12/12	doplnit 2 vstupy, edit/delete a live scope
Archiv CVE	typecheck + 43/43	2 husté port/hardening dny
Repo baseline	565 unit; 15 BFF security; build/typecheck/audity OK	Den 10 znovu ověří nový RC
Playwright archivů	runtime neproveden: sandbox bind EPERM	zdroj scénářů existuje; runtime musí CI/povolené prostředí

02 / KAPACITA

Proč už žádný den není „jen jedna drobnost“

Každý den má 7,5 hodiny konkrétní práce: vertikálu, hardening, testy a důkaz.

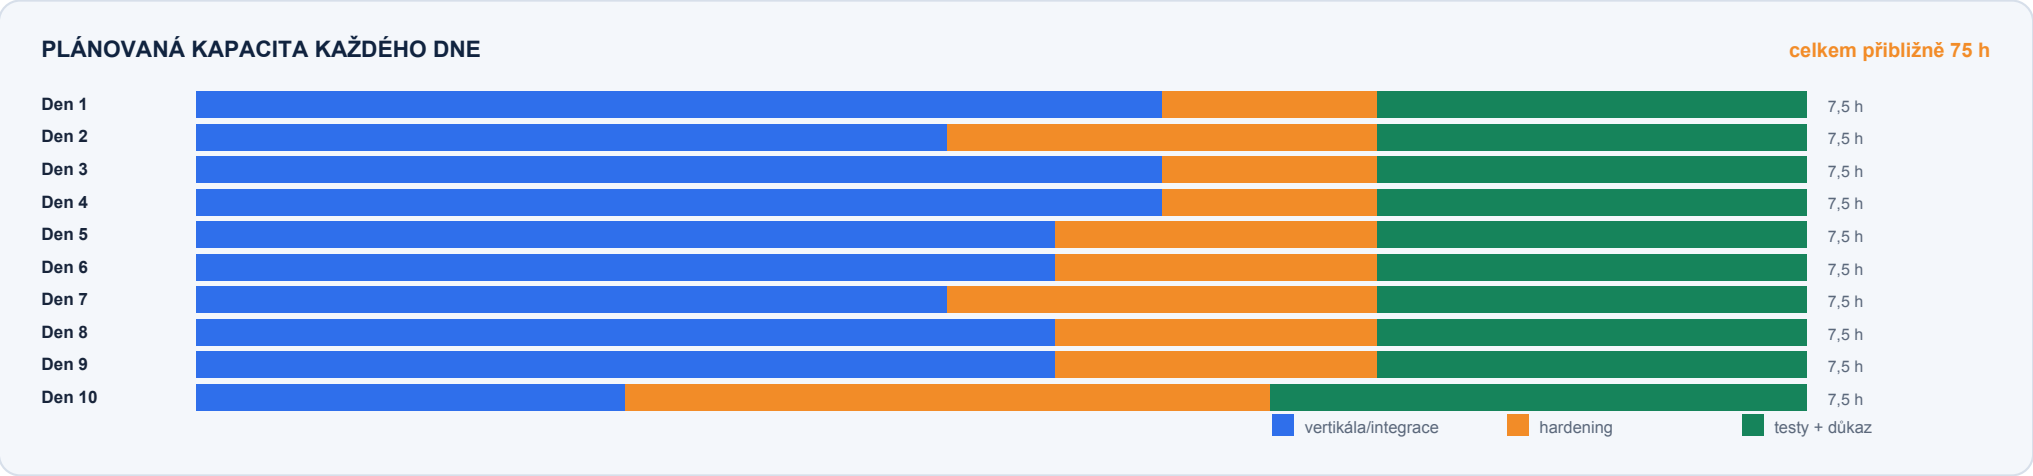

DENNÍ KONTRAKT	NEPLÝTVAT ČASEM	PŘI SKLUZU NEŠKRTAT
• 2 viditelné výsledky nebo 1 velká vertikála + hardening • nejméně 1 negativní permission scénář • desktop; mobil podle relevance • commit + CI pro přesný SHA	• nepřepisovat hotový graf/DNS detail/profil • incident UI nestavět proti admin_only API • nepřenášet starý raw enum UX • neimplementovat frontendovou bezpečnost za backend	• permission/direct-ID testy • TSIG secret scan • cleanup testovacích dat • CS/EN + mobilní minimum • CI a přesný známý blocker

POVINNÝ DENNÍ DŮKAZ

Git SHA + CI URL · pojmenované testy · desktop/mobil nebo měření · live vs. mock jasně označeno · blocker a první krok na zítřek

03 / ROADMAPA

Deset pracovních dnů, dvacet ukazatelných posunů

Víkendy jsou pouze krátké volitelné UAT/triage body bez implementace.

Den	Hlavní výsledek	Druhý výsledek	Důkaz
1 · Čt 30. 7.	subdataset self-service komplet	Praha IP hardening 3+3+3	3 vstupy + permission matice
2 · Pá 31. 7.	Účet Prostředky	build SHA + incident proof	profil + manifest + 403
3 · Po 3. 8.	CVE admin CRUD	public detail/privacy	role matice
4 · Út 4. 8.	CVE lifecycle	readiness/affected/outage	live cleanup
5 · St 5. 8.	DNS primary/secondary create	landing + server UX	payloady + oba detaily
6 · Čt 6. 8.	transfer-log API/UI	responsive detail/stavy	fixture + E2E
7 · Pá 7. 8.	TSIG/server scope	secret scan + Network baseline	foreign-ID + HAR
8 · Po 10. 8.	Network bez N+1	tabs + lazy traffic/period	before/after
9 · Út 11. 8.	user Live lifecycle	admin filtry/drill-down	polling + URL
10 · St 12. 8.	permission/i18n/security	full RC + docs/SHA	full report

SO 1. 8. · 15 MIN
IP + subdataset galerie; max. tři konkrétní připomínky.

NE 2. 8. · 10 MIN
CVE akceptace a privacy otázky.

SO 8. 8. · 30 MIN
UAT CVE + secondary DNS + transfer log.

NE 9. 8. · 15 MIN
Network/RC scope: blocker vs. odložit.

04 / DEN 1

Čt 30. 7. · Dokončit samoobsluhu subdatasetů

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

HEAD NAS create + e5abd0b + 743dc9a/fb211f9; selektivní port, ne greenfield

UŽ FUNGUJE V HEAD	30. 7. SE DODĚLÁ
• User už založí subdataset z NAS seznamu přes /app/nas/new. • Vlastní dataset už upraví a advanced ZFS je skryté. • Praha Production už se řadí před ostatní lokality.	• Create také z detailu datasetu a VPS → Úložiště. • Edit bezpečných polí + delete pouze own child; root/foreign nikdy. • Busy/retry/double-submit + přesný Praha 3+3+3 výběr.

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	User vytvoří, upraví a bezpečně smaže vlastní child subdataset z NAS, detailu datasetu i VPS Storage.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Admin spolehlivě dostane nahoře max. 3 public IPv4 + 3 private IPv4 + 3 IPv6 z Praha Production.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Potvrdit existující NAS create; vypsát pouze chybějící bloky a konflikty.
09:30	Jeden capability/owner gate, tři CTA, minimální create a edit bezpečných polí.
11:30	Create → detail → změna velikosti/nastavení; ověřit přesné payloady.
13:00	Delete jen own child; confirm dopadu, root/foreign zákaz, cancel = 0 requestů.
14:30	Busy, error/retry, double-submit a cleanup testovacích dat v finally.
15:15	Praha IP: owner null, primary location, keyset scan a přesné 3+3+3.
16:15	CS/EN, desktop/mobil, unit/E2E, typecheck, build, screenshoty a GitHub CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• Všechny 3 vstupy vedou ke stejnému formuláři a pravidlům. • User spravuje jen own child; root/foreign direct ID je zakázané. • Advanced ZFS zůstává admin-only; cancel ani double-submit nemutuje. • Praha blok má max. 9 řádků, žádnou vlastněnou/cizí-location IP.	• 3 vstupy + create/edit/delete • own/root/foreign • busy/retry/double • IP owner/keyset + mobil	Důkaz: Workflow galerie, payload capture, permission matice, IP desktop/mobil a CI URL. Riziko: API skrývá user_create/user_destroy flagy; server musí zůstat autoritou a live owner test je povinný.

04 / DEN 2

Pá 31. 7. · Užitečnější Prostředky + ověřitelný build

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Subdatasety jsou uzavřené v Dni 1; profilový základ je hotový v HEAD

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	Účet → Prostředky ukáže read-only balíčky a konfiguraci prostředí bez nového rozcestníku.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Build vytvoří bezpečný manifest s Git SHA pro budoucí parity gate.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 3	Incident create má live capability/403 důkaz a přesné backendové zadání místo mrtvého CTA.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Profile Resources kontrakt: zdroj balíčků/prostředí a přesný user scope.
09:45	Read-only balíčky, prostředí a kapacity; responsive loading/empty/error.
13:00	Own/foreign permission testy a nulová editace balíčků/prostředí.
14:00	Build provenance: SHA manifest bez artefaktů a secretů v gitu.
15:00	Incident capability + least-privileged POST/403 + přesný backend spec.
16:00	Profile CS/EN desktop/mobil, SHA parity test, typecheck, build a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• Profil neumožní editaci cizích balíčků ani prostředí. • Nevznikne „rychlá správa účtu“ ani duplikovaný panel. • Manifest jednoznačně odkazuje na commit a neobsahuje tajné údaje. • Incident CTA se neukáže bez skutečné serverové capability.	• Profile own/foreign • loading/error/retry • build manifest • incident capability/403	Důkaz: Profil CS/EN a dvě šířky, manifest, incident capture a CI URL. Riziko: Balíčky/prostředí musí být read-only a scopeované; nevytvářet další rychlou správu účtu.

04 / DEN 3

Po 3. 8. · CVE admin základ + veřejný detail

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽIJE

deb8b7e: 55 souborů / 7k+ řádků; ruční doménový port

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	Capability-gated admin seznam, filtry, detail a editor konceptu advisory/CVE.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Veřejný detail ukáže pouze publikovatelná pole; draft a interní poznámky jsou skryté.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Runtime capability probe admin/support/user; nepřevzít role-only gate.
10:00	API model, router, list/detail, loading/empty/error a lokalizované stavy.
13:00	Draft editor, CVE validace, create/edit payload, submit lock a retry.
14:30	Public detail s allowlistem polí a draft hidden/not-found.
15:15	User/support direct URL, 403 a anonymní response privacy capture.
16:15	Unit/component/E2E, CS/EN, mobilní screenshoty a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• Admin vytvoří a znovu otevře draft. • User/support nemají route ani mutaci. • UI nevykreslí note/reporter_name ani další interní pole. • Raw citlivá anonymní API data jsou explicitní upstream blocker.	• gate matrix • draft CRUD • public privacy • error/retry + mobile	Důkaz: Admin/user/support pohled, draft payload, redigovaný response capture a CI. Riziko: Monolitický commit koliduje v routeru, i18n, dashboardu a public testu; nepoužít slepý merge.

04 / DEN 4

Út 4. 8. · CVE lifecycle + vztahy a dopad

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

publish/retract, node readiness a relations už mají zdrojový základ v deb8b7e

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1

Publish/retract/update/rebuild mají potvrzení dopadu a správný veřejný stav.

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2

Detail ukáže node readiness, affected users/VPS a outage vazby s bezpečným scope.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Lifecycle capability, potvrzovací dialogy a přesné state transition payloady.
10:30	CVE normalize/reconcile, conflict/retry a lokalizované stavy.
13:00	Node readiness a assessment detail.
14:15	Affected users/VPS + outage relation create/remove.
15:15	Disposable live draft/lifecycle bez mail side-effectu, cleanup v finally.
16:00	Public/admin mobil, workflow dokumentace a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• První publish/retract klik nic nemění. • Public detail odpovídá publish stavu. • Duplicate relation a konflikt mají čitelný retry stav. • Live test nezanechá advisory, update ani relation.	• lifecycle • readiness/relations • public before/after • live cleanup	Důkaz: Lifecycle timeline, public before/after, relation a cleanup log. Riziko: Outage relations jsou první kandidát na odklad; bezpečný CRUD/publish se neobětuje.

04 / DEN 5

St 5. 8. · Primary/secondary DNS create

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Incident capability je uzavřená v Dni 2; DNS detail split a blank record TTL už jsou hotové

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	DNS create začíná Primary/Secondary, ukáže jen relevantní pole a otevře správný landing tab.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Secondary workflow nastaví vlastní servery/peery a po vytvoření neukáže primary-only CRUD záznamů.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Kontrakt type/source enumů, serverových polí, capability a cílových detailů.
10:00	Sdílený create model, relevantní pole, validace a přesné payloady.
11:30	Primary regrese bez nového klikání; landing na Záznamy.
13:00	Secondary servery/peery, správný source a žádný primary-only CRUD.
14:30	Primary → Záznamy; secondary → Servery/Transfery s jasným dalším krokem.
15:15	Absence polí, invalid server, API error/retry, double-submit, mobil a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• Primary/secondary mají rozdílný přesný payload. • Nerelevantní pole nejsou v DOM ani payloadu. • Primary nemá krok navíc; secondary skončí na serverovém workflow. • Blank TTL a existující detail split projdou regresí.	• primary/secondary payload • absence polí • server error/retry • landing + mobile	Důkaz: Dva request captures, dva formuláře, oba cílové detaily a CI. Riziko: Nejasný enum se netipuje; podporované hodnoty musí potvrdit API kontrakt.

04 / DEN 6

Čt 6. 8. · Skutečný DNS transfer log

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Transfers konfigurace peerů zůstává; snapshot server_zones není historie

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	Secondary zóna zobrazí dns_server_zone_transfer_log: čas, server, stav, primary, serial, reason a message.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Konfigurace transferů a historie jsou srozumitelně oddělené, lokalizované a responzivní.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Endpoint/includes/cursor/order/capability a localized state/reason labels.
10:00	Typed API klient, normalizace a keyset pagination bez nového any na hranici.
11:30	Model testy pro empty, partial relation a raw fallback.
13:00	Compact tabulka + expandable detail/message, primary adresa a serial.
14:30	Loading, empty, retry, unavailable a stale stavy.
15:15	Secondary log/no-log/error; primary absence; desktop/mobil a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
- Log používá skutečný transfer objekt. - Primary zóna nemá nesmyslný secondary log. - Dlouhá message nerozbije layout a raw enum není hlavní text. - Chybějící endpoint vede k poctivému unavailable stavu a API gapu.	- API/model - pagination - secondary empty/error - primary absence + mobile	Důkaz: Response fixture, tabulka/detail, error/empty a CI URL. Riziko: API objekt může mít jiný scope nebo includes; nejdřív kontrakt, potom UI.

04 / DEN 7

Pá 7. 8. · TSIG/server security + Network baseline

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Admin TSIG stránka existuje; user Transfers dnes načítá globální seznam

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	User/admin TSIG scope je oddělený, admin klíče filtrují vlastníka zóny a cizí ID neprojde.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Secret je maskovaný/explicitně odhalený a WebUI ho nevypouští do URL, toastu, trace ani screenshotu.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 3	Uživatelská Síť má uložený request-count a TTF-content baseline.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Capability/user filter/foreign direct-ID/403 audit pro TSIG a zone servers.
10:00	User/admin split bez arbitrary UserLookupInput; owner-filtered query keys.
11:30	Mask/reveal/copy lifecycle; přiznat API limit, pokud secret vrací index/show.
13:00	Server assignment s odvozeným peer type, capability create/delete a confirm.
14:15	Foreign key/server, in-use, cancel, retry a double-submit testy.
15:15	Secret scan + Network HAR/request/TTF-content baseline + CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• User query není globálních 200 klíčů bez scope. • Secret se neobjeví v běžném listu ani telemetry artefaktech. • Delete má confirm a cancel má 0 requestů. • Network baseline obsahuje počet VPS a šest traffic requestů.	• scope/foreign ID • secret lifecycle • server mutation • Network baseline	Důkaz: Scope matice, maskovaný secret dialog, scan a HAR baseline. Riziko: Skutečné one-time-only tajemství vyžaduje API změnu, pokud index/show vrací secret.

04 / DEN 8

Po 10. 8. · Sít' bez N+1 + lazy záložky

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Velký graf a Overview/Breakdown už existují a zůstávají

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	Adresy se načtou bez jednoho IP requestu na každou VPS.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Page-level Adresy/Provozi/Živě; na Adresách je 0 accounting/live requestů.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 3	Provoz se načte po kliknutí a starší období je uvnitř stejné záložky.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	Batch/filter kontrakt, before graph a přesný request budget.
10:00	Jeden bezpečný filtrovaný/batch IP dotaz nebo dokumentovaný bounded fallback.
13:00	URL-stabilní page tabs, historie prohlížeče, klávesnice a mobil.
14:00	Lazy traffic query, skeleton/error/retry a 0 requestů na Adresách.
14:45	Rychlých 6 měsíců + starší/custom interval až po explicitní volbě.
15:30	0/1/25/250 VPS request-budget E2E, before/after HAR, CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
- Request count neroste lineárně s VPS. - Traffic nezačne před otevřením Provozu. - Existing chart/Breakdown nepřeteče na mobilu. - Ownership a lokální kompatibilita mají regresní test.	- request budget - lazy tabs - period selection - scope + mobile	Důkaz: Request diagram, before/after HAR, taby desktop/mobil a CI. Riziko: Bez batch API se použije pevný bounded fallback; nevznikne vlastní složitá klientská cache.

04 / DEN 9

Út 11. 8. · User live + admin network drill-down

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Admin live/traffic základ i API parametry existují; UI je jen nevyužívá

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1

User Live polluje pouze na aktivní záložce a zastaví se při skrytí/opuštění.

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2

Admin live/traffic nabídne environment/location/node/VPS, URL persistence a odkazy na detail.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	User-owned interface/VPS scope, cadence a unavailable kontrakt.
10:00	Active-tab + visibility/focus lifecycle a cleanup při unmount.
11:30	Offline/error/backoff/retry bez request stormu.
13:00	Admin environment/location/node/VPS filtry a přesné API params.
14:15	VPS/interface/user drill-down se zachováním filtrů při návratu/reloadu.
15:00	Fake-time polling E2E, URL persistence, mobilní filtry, docs a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• Neaktivní Live má 0 requestů. • Po odchodu nepřibývají requesty a návrat obnoví pouze jeden timer. • User nevidí cizí interface/VPS. • Admin filtry jsou sdílené odkazem a mapují se do payloadu.	• polling lifecycle • foreign data • admin payload • URL + mobile	Důkaz: Polling timeline, admin request capture, deep-link návrat a CI. Riziko: Nedostupný live endpoint musí dát poctivý unavailable stav, ne simulovaná data.

04 / DEN 10

St 12. 8. · Cross-UI hardening + release candidate

Kapacita 7,5 h · nejméně dva ukazatelné výsledky · testy a důkaz ještě tentýž den

CO UŽ SE VYUŽÍJE

Existující code/security audit je baseline; den opravuje nové nálezy

VIDITELNÝ VÝSLEDEK 1	Permission/i18n/a11y/mobile/security matice pokrývá všechny změněné sekce.
VIDITELNÝ VÝSLEDEK 2	Jeden RC build má full test report, screenshot galerii, release notes a SHA/checksum postup.

Čas	Konkrétní práce a výstup
09:00	User/support/admin × own/foreign × CTA/direct URL/server 403 matice.
10:15	CS/EN, API label/name, raw enum scan, dlouhé texty a date/time.
11:00	Focus trap, taby, modaly, klávesnice, 375px overflow.
13:00	XSS corpus, TSIG secret, CSP, dependency a mutation audit.
14:00	ci:check, typecheck, unit, BFF security, build, full desktop + mobile.
15:15	Safe live smoke s disposable cleanupem, pokud jsou credentials.
16:00	Opravy nálezu, galerie, docs, release notes, SHA/checksum gate a CI.

HOTOVO KDYŽ	TESTY	DŮKAZ + RIZIKO
• Žádný známý UI privilege leak. • Mock test je jasně odlišený od server auth důkazu. • Žádné build artefakty, secret ani auth soubory v commitu. • Deploy až po explicitním schválení a ze stejného SHA.	• full CI • full desktop • mobile smoke • security/audits + safe live	Důkaz: Matice, galerie, full report, CI URL, Git SHA a checksum procedura. Riziko: Červené CI nebo rozdílný SHA je NO-GO; tento den nepohlí nová feature.

05 / ZÁVISLOSTI

Co na čem stojí a kde frontend nesmí lhát

Sekvence chrání bezpečnostní baseline a omezuje rozpracované změny.

Proud	Vstup	Brána	Navazuje
Integrace	HEAD a6aecb4 + 3 feature snapshoty	cílené testy po každém portu	CVE/DNS/Network na jediném baseline
Subdatasetsy	owner_or_admin API matice	least-privileged live create/delete	Profile Resources a release permission matrix
CVE	admin capability + public privacy	CRUD zelený před lifecycle	publish → readiness → relations
Incident	Create admin_only	žádné user CTA bez backend změny	upstream spec, pak samostatná budoucí fáze
DNS	potvrzené enumy a scope	secondary payload před transfer logem	create → history → TSIG/servers
Síť	request baseline + batch/filter kontrakt	lazy tabs před user Live	N+1 → tabs → polling → admin filters
Release	všechny checkpointy v jednom SHA	green CI + clean worktree	human review; deploy až po schválení

API BLOCKER: INCIDENT	API LIMIT: TSIG SECRET	PERFORMANCE BRÁNA
• Create je admin_only • ověřit 403 nejméně privilegovaným účtem • sepsat capability + owner scope • frontend do té doby jen index/show	• index/show dnes může vrátet secret • WebUI maskuje a nekopíruje automaticky • one-time-only vyžaduje backend kontrakt • API limit zůstává explicitní	• batch/filter je preferovaný • bounded fallback má pevný budget • 0 traffic/live requestů na Adresách • před/po HAR je povinný

POŘADÍ ŠKRTÁNÍ PŘI SKLUZU

1. CVE outage relations · 2. TSIG server mutace · 3. admin traffic drill-down. Nikdy neškrtat permission testy, secret scan, cleanup, CS/EN, mobilní minimum nebo CI.

06 / KVALITA

Testovací a důkazová matice

Každý feature test má pozitivní, negativní a podle možnosti live serverovou větev.

Oblast	Pozitivní tok	Negativní / security	Live důkaz	Vizuál
Praha IP	3+3+3 + filtry	owned/missing metadata/pagination	read-only list	desktop + mobil
Subdatasets	own create/delete	foreign/cancel/busy/double	least-privileged + cleanup	2 vstupy + confirm
CVE	draft/lifecycle/public	user/support/privacy/conflict	disposable draft + cleanup	admin/public/mobil
Incident	own index/show	Create 403	response capture bez dat	skryté CTA + spec
DNS create	primary + secondary	absence poli/bad server/error	disposable zone + cleanup	2 formy + landing
Transfer log	history + detail	empty/error/primary absence	read-only secondary	desktop + mobil
TSIG/servery	own scope	foreign/secret/cancel/in-use	disposable jen pokud safe	mask/reveal dialog
Network	batch + lazy + live	N+1/inactive/foreign/unavailable	HAR + polling trace	taby + admin filtry
Release	critical paths	red CI/different SHA/secret files	safe smoke	gallery

KÓD

Atomické checkpointy · krátké proč · žádný dist/assets/.vite/node_modules.

TESTY

Unit/integration · přesný payload · Playwright · nezeslabovat assertions.

VIZUÁL

Desktop · mobil · CS/EN · focus/overflow · necitlivá data.

DŮKAZ

CI URL · SHA · live vs mock · HAR/trace · cleanup · známý blocker.

Rizika a rozhodovací brány

Když chybí API nebo CI, mění se cesta — ne bezpečnostní definice hotovo.

Riziko	Pravd.	Dopad	Časný signál	Rozhodnutí
CVE monolit koliduje s cleanupem	vysoká	vysoký	router/i18n/public test conflicts	ruční CRUD/public a lifecycle/relations bloky
Subdataset gate neseďí serveru	střední	vysoký	live 403/neočekávané owner chování	CTA podle capability/scope; API gap
Incident zůstane admin_only	vysoká	střední	capability + live 403	spec upstream; neukazovat mrtvý formulář
Transfer-log objekt není dostupný	střední	střední	endpoint/capability missing	unavailable stav + přesný API gap
TSIG secret vrací index/show	vysoká	kritický	secret v API response	mask UI; backend one-time kontrakt
Batch IP dotaz není podporován	střední	střední	request count roste s VPS	bounded fallback + budget; backend úkol
E2E zanechá data	střední	vysoký	objekt po testu	unikátní prefix + finally cleanup
CI/GitHub nelze ověřit	střední	vysoký	DNS/network failure	neoznačit RC zeleně bez externího běhu
Dva weby mají jiný build	střední	vysoký	SHA/checksum mismatch	NO-GO; jeden immutable artefakt po schválení

GO	NO-GO
• capability/payload potvrzené • negativní scénáře zelené • cleanup ověřený • CS/EN + mobil v pořádku • CI zelené pro přesný SHA	• role-only ochrana • secret v listu/URL/trace • foreign direct-ID funguje • red nebo neověřené CI • jiný SHA/checksum • testovací data bez cleanupu

08 / KONTROLNÍ LIST

Každý den musí být vidět, že se projekt posunul

Jedna strana pro denní report a finální RC bránu.

Den	Výsledek A	Výsledek B	Testy	Vizuál	CI	Blocker / rozhodnutí
1 / Čt 30. 7.	[]	[]	[]	[]	[]	
2 / Pá 31. 7.	[]	[]	[]	[]	[]	
3 / Po 3. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
4 / Út 4. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
5 / St 5. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
6 / Čt 6. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
7 / Pá 7. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
8 / Po 10. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
9 / Út 11. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	
10 / St 12. 8.	[]	[]	[]	[]	[]	

FINÁLNÍ RC CHECKLIST	NASAZENÍ AŽ PO EXPLICITNÍM SCHVÁLENÍ
• 20 denních výsledků hotovo nebo vědomě odloženo • permission matrix user/support/admin + direct-ID • CS/EN bez raw enumů v hlavních tocích • typecheck, unit, BFF security, build a auditý zelené • full desktop + mobile smoke • live data uklizená • čistý worktree a projektová dokumentace	• jeden immutable build artefakt • stejný Git SHA na clankerdev.vpsfree.cz i dev.crucio.cz • stejný checksum statických assetů • smoke obou webů po budoucím deployi • finální screenshot verze a kritických flow • při jakémkoliv rozdílu okamžitý NO-GO • žádné server/db/secret změny z tohoto plánu

DENNÍ REPORT
Výsledek A · výsledek B · commit/SHA · pojmenované testy · CI URL · screenshot/HAR/trace · live vs mock · blocker · první krok dalšího dne
